



# **Informe de seguimiento a proyectos de inversión**

Enero - Septiembre 2025

Oficina Asesora de Planeación y Estudios  
Sectoriales – Grupo de Planeación

Noviembre de 2025



## Contenido

1. Generalidades .....	3
2. Ejecución Financiera de proyectos de inversión .....	5
2.1 Ejecución Presupuestal consolidada .....	5
2.2 Ejecución presupuestal por proyecto .....	6
3. Ejecución física de proyectos de inversión.....	8
4. Conclusiones y Recomendaciones .....	14
4.1 Conclusiones .....	14
4.2 Recomendaciones .....	14

## 1. Generalidades

El presente documento se realiza a partir de los datos e información registrados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP, del Departamento Nacional de Planeación DNP.

El seguimiento que efectúa la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales a través del Grupo Planeación, se fundamenta en los criterios de avance y cumplimiento respecto de la ejecución presupuestal de los recursos financieros asignados a cada proyecto, evidenciables en la información generada en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación y en la información registrada por los responsables/gerentes de proyectos en la PIIP de manera mensual, con los cuales se busca generar alertas tempranas e información clave que se constituyen en herramienta que contribuye a que los directores/gerentes de proyectos tomen decisiones pertinentes y adecuadas para avanzar de manera oportuna en la ejecución y desempeño de los proyectos de inversión a su cargo.

El presente informe analiza los resultados financieros y de producto a partir de los siguientes rangos de gestión establecidos para los indicadores de gestión de los proyectos de inversión:

**% de Ejecución** = Obligación / Apropriación Vigente

**% de Avance Físico del Producto** = Porcentaje de Avance Indicadores de Producto que corresponde al porcentaje de ejecución registrado de los productos en la PIIP.

Como parte de la metodología se han definido los siguientes rangos de evaluación tanto para el avance financiero como el avance en cumplimiento de metas de producto.

BAJO	MEDIO	ALTO	SOBRE EJECUCIÓN
<80%	≥80% - <90%	≥90% - 100%	≥ 100%

Es pertinente indicar que, con la presentación de este informe de seguimiento a los proyectos de inversión, se da cumplimiento a lo establecido en el procedimiento DESP05 “Formulación y seguimiento de proyectos de inversión pública” y la Resolución 435 de 2024 del Ministerio de Salud y Protección Social.

Adicionalmente, este informe contribuye al ejercicio de autoevaluación que realiza la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, en su rol como uno de los integrantes de la segunda línea de defensa dentro del Sistema de Control Interno, orientado a fortalecer la gestión del riesgo y la efectividad de los controles implementados, mediante la supervisión y monitoreo de los procesos estratégicos y misionales. En este sentido, el seguimiento a los proyectos de inversión contribuye a asegurar un enfoque integral que promueve la transparencia, la mejora continua y la rendición de cuentas en el marco del Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

El presente informe de seguimiento es realizado para los proyectos de inversión de la unidad ejecutora de presupuesto 19-01-01 Ministerio de Salud y Protección Social – Gestión General. No se incluyen los del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) teniendo en cuenta que presupuestalmente este último es una unidad ejecutora independiente a Minsalud.

Se precisa que, a partir del mes de junio de la vigencia 2025 inició la ejecución del proyecto de inversión BPIN 202500000025369 – “Fortalecimiento a la prestación de los servicios de salud en el componente de transporte asistencial en el territorio nacional”

En este sentido, los proyectos de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social en la vigencia 2025 y su apropiación son los siguientes:

**Tabla 1.** Apropiación vigente por proyecto de inversión MinSalud. Vigencia 2025

Programa Presupuestal	BPIN	Proyecto de inversión	Apropiación vigente
1999 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector salud	202300000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	\$ 5.020.592.381
	202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	\$ 9.717.987.739
	202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social nacional	\$ 119.720.000.000
<b>Total 1999</b>			<b>\$134.458.580.120</b>
1905 - Salud pública	2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional	\$ 4.000.000.000
	202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	\$ 4.000.000.000
	202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	\$ 33.000.000.000
	202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	\$ 193.000.000.000
	202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	\$ 643.360.000.000
	202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres Nacional	\$ 3.300.000.000
	202500000025369	Fortalecimiento a la prestación de los servicios de salud en el componente de transporte asistencial en el territorio Nacional	\$ 6.700.000.000
<b>Total 1905</b>			<b>\$887.360.000.000</b>
1906 - Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud	202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	\$ 2.000.000.000
	202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	\$ 1.900.000.000
	202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	\$ 11.715.371.800
	202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	\$ 4.522.494.319
	202400000000162	Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional	\$ 887.869.741.116
<b>Total 1906</b>			<b>\$908.007.607.235</b>
<b>Total</b>			<b>\$1.929.826.187.355</b>

**Fuente.** Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Octubre de 2025)

## 2. Ejecución Financiera de proyectos de inversión

### 2.1 Ejecución presupuestal consolidada

Para la vigencia 2025 el Ministerio de Salud y Protección Social cuenta con un total de apropiación presupuestal vigente en inversión por valor de \$1.929.826.187.355 la cual se distribuye en 15 proyectos de inversión.

En la siguiente tabla se presenta la ejecución de recursos con corte a 30 de septiembre de 2025, en cuanto a compromisos y obligaciones.


**Tabla 2.** Consolidado de ejecución de recursos inversión a 30 de septiembre de 2025

Apropiación vigente	Compromisos	% de Compromisos	Obligaciones	% Obligación
\$1.929.826.187.355	\$1.397.509.503.182	72,4%	\$526.016.280.231	27,3%

**Fuente.** Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Octubre de 2025)

El resultado de la ejecución presupuestal de los recursos de inversión al 30 de septiembre de 2025 fue del 27,3%. Es decir, se obligó presupuestalmente un total de \$526.016.280.231.

**Ilustración 1.** Ejecución financiera consolidada de recursos de inversión a 30 de septiembre de 2025

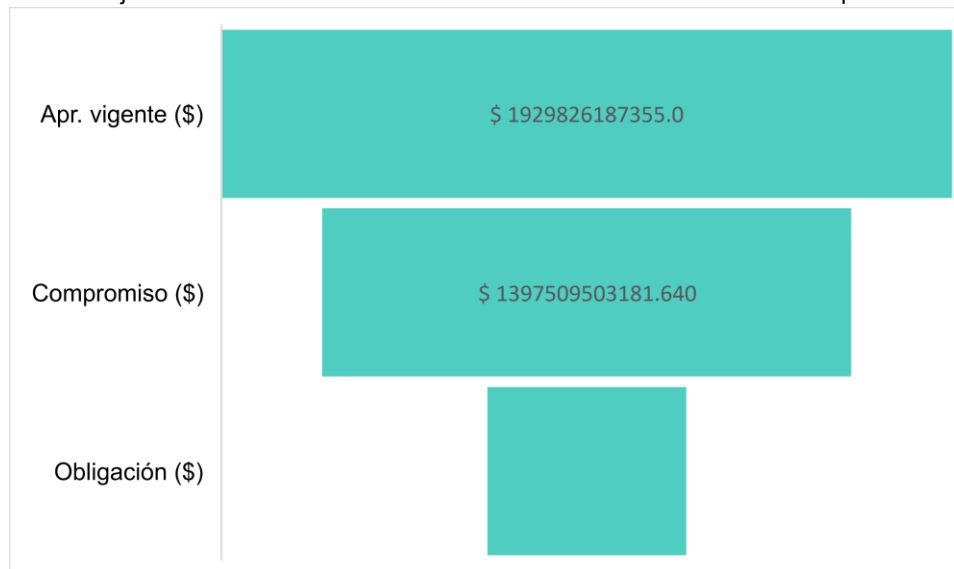

**Fuente.** Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Octubre de 2025)

## 2.2 Ejecución presupuestal por proyecto

En la siguiente tabla se presentan los resultados de ejecución financiera para cada uno de los 15 proyectos de inversión que ejecuta el Ministerio de Salud y Protección Social en la vigencia 2025.

**Tabla 3.** Ejecución financiera por proyecto de inversión MinSalud 2025 (corte 30 de septiembre)

BPIN	Proyecto de inversión	Apr. Vigente	Compromiso	% Compr.	Obligación	% Oblig.
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel Nacional	\$ 1.900.000.000	\$ 1.869.187.704	98,4%	\$ 1.455.778.275	76,6%
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres Nacional	\$ 3.300.000.000	\$ 3.257.896.153	98,7%	\$ 2.251.723.999	68,2%
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel Nacional	\$ 4.000.000.000	\$ 3.917.476.943	97,9%	\$ 2.486.743.163	62,2%
202300000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	\$ 5.020.592.381	\$ 4.785.369.191	95,3%	\$ 3.040.043.345	60,6%
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana. Nacional	\$ 4.000.000.000	\$ 3.453.712.205	86,3%	\$ 2.175.599.844	54,4%
202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social Nacional	\$ 9.717.987.739	\$ 8.250.233.406	84,9%	\$ 4.757.582.386	49,0%
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud Nacional	\$ 4.522.494.319	\$ 3.810.932.034	84,3%	\$ 2.148.761.043	47,5%
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel Nacional	\$ 11.715.371.800	\$ 9.922.585.215	84,7%	\$ 5.400.538.489	46,1%
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social Nacional	\$ 119.720.000.000	\$ 104.864.131.473	87,6%	\$ 42.048.855.933	35,1%
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia Nacional	\$ 2.000.000.000	\$ 1.975.153.245	98,8%	\$ 665.248.618	33,3%
202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema para la toma de decisiones en salud. Nacional	\$ 33.000.000.000	\$ 32.329.388.534	98,0%	\$ 10.233.553.808	31,0%
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Nacional	\$ 193.000.000.000	\$ 156.850.561.302	81,3%	\$ 59.441.219.813	30,8%
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio Nacional	\$ 643.360.000.000	\$ 605.400.171.909	94,1%	\$ 196.845.479.684	30,6%
202400000000162	Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud Nacional	\$ 887.869.741.116	\$ 456.715.939.957	51,4%	\$ 193.065.151.831	21,7%
202500000025369	Fortalecimiento a la prestación de los servicios de salud en el componente de transporte asistencial en el territorio Nacional	\$ 6.700.000.000	\$ 106.763.912	1,6%	-	0,0%
<b>Total</b>		<b>\$1.929.826.187.355</b>	<b>\$1.397.509.503.182</b>	<b>72,4%</b>	<b>\$526.016.280.231</b>	<b>27,3%</b>

Fuente. Sistema Integrado de Información Financiera SIIF – Nación. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (Octubre de 2025)

Según los datos contenidos en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación, y de acuerdo con los rangos de gestión establecidos, para el tercer trimestre de la vigencia 2025



los 15 proyectos de inversión del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentran en nivel de ejecución acumulado bajo con respecto a las obligaciones. La ejecución total consolidada acumulada de los proyectos de inversión para el tercer trimestre de la vigencia 2025, se encuentra en nivel bajo.

### 3. Ejecución física de proyectos de inversión

El resultado de la ejecución física de los proyectos de inversión se analiza a través de la entrega de resultados/productos de cada proyecto, según los productos definidos en la formulación de cada proyecto y sus indicadores. Los datos de ejecución física son tomados de la información registrada en la PIIP por parte de los gerentes/directores de cada proyecto en el seguimiento mensual a los proyectos de inversión.

En la siguiente tabla se presentan de manera consolidada los avances en la entrega de productos de los proyectos de inversión en la vigencia 2025.

**Tabla 4.** Ejecución física (Avance en productos) de proyectos de inversión MinSalud 2025 (corte 30 de septiembre)

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta vigencia 2025	Avance vigencia 2025	% Avance
2022011000097	Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional	Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	13	0	0,00%
		Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	12	0	0,00%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	10	0	0,00%
20230000000306	Fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	25	14	56,00%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	34	23	67,65%
		Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	Sistema de Gestión implementado	2	0	0,00%
202300000000312	Optimización de las capacidades de gestión del Ministerio de Salud y Protección Social nacional	Documentos de investigación en temáticas de la gestión estratégica del talento humano	Documentos de investigación elaborados	0	0	0,00%
		Documentos de lineamientos técnicos de procesos administrativos, de atención a la ciudadanía, comunicación y participación en el MSPS	Documentos de lineamientos técnicos realizados	2	1,429	71,45%
		Documentos metodológicos de procesos administrativos, de atención a la ciudadanía, participación y comunicación en el MSPS	Documentos metodológicos realizados	8	6,835	85,44%
		Documentos metodológicos que potencian la eficiencia del talento humano, en términos de competencias técnicas y humanas	Documentos metodológicos realizados	1	0	0,00%
		Sedes adecuadas	Sedes adecuadas	2	2,042	102,10%
		Sedes adquiridas	Sedes adquiridas	0	0	0,00%
		Sedes dotadas	Sedes dotadas	2	2,063	103,15%
		Servicio de Apoyo Financiero para el Fortalecimiento del Talento Humano	Funcionarios apoyados	300	128,572	42,86%
		Servicio de asistencia técnica en participación ciudadana	Asistencias técnicas realizadas	38	18,524	48,75%



BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta vigencia 2025	Avance vigencia 2025	% Avance
		Servicio de gestión documental actualizado	Sistema de gestión documental actualizado	0,25	0,583	233,20%
		Servicios de información implementados (1)	Sistemas de información implementados	2	125	6250,00%
202300000000348	Fortalecimiento de la gestión de calidad en salud para el sistema de salud de Colombia nacional	Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0	0,00%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	3	2	66,67%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	32	29	90,63%
202300000000349	Consolidación del sistema nacional de información y banco de datos del sector salud y protección social nacional	Documento para la planeación estratégica en TI	Documentos para la planeación estratégica en TI	2	0,6	30,00%
		Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	49	38,38	78,33%
202300000000413	Desarrollo e implementación mecanismos para el fortalecimiento de la planificación, distribución y gestión del Talento Humano en Salud a nivel nacional	Documento de lineamientos técnicos relacionados en el Talento Humano en Salud	Documentos de lineamientos técnicos realizados	0	0	0,00%
		Documentos de evaluación de pertinencia y de la relación docencia servicio	Documentos de evaluación realizados	260	158	60,77%
		Documentos de planeación - Planes, programas, proyectos, políticas, en relación con el Talento Humano en Salud.	Documentos de planeación con seguimiento realizado	2	0	0,00%
		Documentos normativos - Normatividad para el Talento Humano en Salud	Documentos de planeación realizados	1	0	0,00%
		Documentos normativos - Normatividad para el Talento Humano en Salud	Documentos normativos realizados	6	6	100,00%
		Servicio de asistencia técnica - Asistencias técnicas a entidades	Asistencias técnicas realizadas	30	8	26,67%
		Servicios de información actualizados - Registro Único de Talento Humano en Salud, Observatorio de Talento Humano en Salud, Aplicativo Servicio Social Obligatorio.	Sistemas de información actualizados	2	0	0,00%
202300000000436	Mejoramiento de la rectoría y regulación de las tecnologías en salud para atender las necesidades de la población colombiana nacional	Documentos de investigación	Documentos de investigación elaborados	0,25	0	0,00%
		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	1	0	0,00%
		Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	1	0	0,00%
		Documentos normativos para la regulación de tecnologías en salud	Documentos normativos realizados	9	8	88,89%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	17	10	58,82%
		Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	1	0	0,00%
202300000000437	Optimización de los procesos de planeación integral en salud pública para mejorar la efectividad en la orientación de los actores del sistema	Documentos de investigación (1)	Documentos de investigación elaborados	1	25	2500,00%
		Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	9	7	77,78%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	0	0	0,00%

<sup>1</sup> Frente a la ejecución desbordada que presenta el indicador de producto, la dependencia informa que por error en la conceptualización del indicador registró una ejecución muy superior a la meta. Desde la OAPES se solicitó a la dependencia gestionar la corrección en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Soporte PIIP dio respuesta indicando que la información reportada en periodos anteriores no se puede modificar.

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta vigencia 2025	Avance vigencia 2025	% Avance
	para la toma de decisiones en salud nacional	Documentos metodológicos	Documentos metodológicos realizados	0	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	0	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	250	167	66,80%
		Servicios de información actualizados	Sistemas de información actualizados	0	4	0,00%
202300000000446	Fortalecimiento del sistema de protección social para la garantía del derecho a la salud a nivel nacional	Documento de lineamientos técnicos para la regulación del acceso al sistema de salud, riesgos laborales y pensiones (2)	Documentos de lineamientos técnicos realizados	3	162455603	5.415.186.767%
		Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	1	0,83	83,00%
		Documentos normativos para la regulación de beneficios costos y tarifas del acceso al sistema de salud	Documentos normativos realizados	5	4,16	83,20%
		Documentos normativos para la regulación del acceso al sistema de salud, riesgos laborales y pensiones (2)	Documentos normativos realizados	3	167886300	5.596.210.000%
		Documentos normativos sobre el uso de los recursos del sector salud que afecten la sostenibilidad del SGSSS	Documentos normativos realizados	5	4	80,00%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	37	37	100,00%
202300000000447	Incorporación del enfoque diferencial para el goce efectivo del derecho a la salud y la promoción social, que potencien la seguridad humana y oportunidades de bienestar para las poblaciones en condición de vulnerabilidad nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	4	1	25,00%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	5	0	0,00%
		Servicio de apoyo financiero para la salud pública	Entidades apoyadas financieramente	0	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	839	526	62,69%
		Servicio de atención psicosocial a víctimas del conflicto armado	Personas víctimas del conflicto armado atendidas con atención psicosocial	64520	36392	56,40%
		Servicio de certificación de discapacidad para las personas con discapacidad	Personas con servicio de certificación de discapacidad	128861	96736	75,07%
		Servicio de promoción de la participación social en salud - Mecanismos y espacios de participación social en salud conformados	Estrategias de promoción de la participación social en salud implementadas	20	17	85,00%
		Servicio de promoción de la salud	Estrategias de promoción de la salud implementadas	4	0	0,00%
202300000000448	Incremento de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población del territorio nacional	Documentos de evaluación	Documentos de evaluación realizados	1	0	0,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	26	18	69,23%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	296	254	85,81%

<sup>2</sup> Frente a la ejecución desbordada que presenta el indicador de producto, la dependencia Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones informa que por error registró ejecución financiera donde debía ingresar avance en la meta de producto. Desde la OAPES se solicitó a la dependencia gestionar la corrección en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Soporte PIIP dio respuesta indicando que la información reportada en periodos anteriores no se puede modificar.

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta vigencia 2025	Avance vigencia 2025	% Avance
		Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas	Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas	5	3	60,00%
		Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva	Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas	5	3	60,00%
		Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales	Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas	5	3	60,00%
		Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes	Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas	4	2	50,00%
		Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas	4	2	50,00%
		Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas	Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones endemo-epidémicas implementadas	6	3	50,00%
		Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas	10	6	60,00%
		Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles	Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas	4	3	75,00%
		Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos	Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	2	1	50,00%
			Estrategias de gestión para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos implementadas	0	0	0,00%
		Servicio de promoción de la salud	Estrategias de promoción de la salud implementadas	1	0	0,00%
		Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles	Campañas de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas	1386	734	52,96%
		Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	37	111	300,00%
		Servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública - Medicamentos e insumos	Entidades territoriales con servicio de suministro de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública	37	111	300,00%

BPIN	Proyecto de inversión	Producto	Indicador	Meta vigencia 2025	Avance vigencia 2025	% Avance
		Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	4	0	0,00%
202300000000449	Mejoramiento del desempeño de la gestión territorial en el sector salud para responder ante situaciones de urgencia, emergencia y desastres nacional	Documentos de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos elaborados	10	3	30,00%
		Documentos de planeación	Documentos de planeación elaborados	2	2	100,00%
		Documentos normativos	Documentos normativos realizados	4	2	50,00%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	94	76	80,85%
		Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	0	0	0,00%
202300000000450	Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud nacional	Documento de lineamientos técnicos	Documentos de lineamientos técnicos realizados	1	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	60	0	0,00%
202400000000162	Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud nacional	Servicio de apoyo financiero para la atención en salud a la población	Instituciones financiadas para la atención en salud a la población	45	0	0,00%
		Servicio de apoyo financiero para la prestación de servicios de salud	Entidades apoyadas financieramente	50	0	0,00%
		Servicio de apoyo para la dotación hospitalaria	Elementos de dotación hospitalaria adquiridos	0	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica	Asistencias técnicas realizadas	15	0	0,00%
		Servicio de asistencia técnica - a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud	Asistencias técnicas realizadas	15	0	0,00%
2025000000025369	Fortalecimiento a la prestación de los servicios de salud en el componente de transporte asistencial en el territorio nacional	Servicio de apoyo financiero para la salud pública - entidades beneficiadas con vehículos de transporte asistencial básico	Entidades apoyadas financieramente	22	0	0,00%

**Fuente.** Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP. Departamento Nacional de Planeación. (Octubre de 2025)

De lo anterior, se observa que al corte septiembre de 2025:

- 9 productos en 4 proyectos de inversión presentan sobre ejecución.
- 66 productos pertenecientes a 14 proyectos de inversión se encuentran en el rango de ejecución Bajo, de los cuales 36 productos presentan avance cero (0).
- Existen 4 proyectos de inversión que no presentan avance alguno en la ejecución física en cuanto a entrega de productos, durante la vigencia 2025. Estos son:
  - BPIN 2022011000097 - Generación de evaluaciones de tecnología en salud basada en la evidencia científica para la toma de decisiones a nivel nacional.
  - BPIN 202300000000450 - Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud con enfoque en Atención Primaria en Salud nacional
  - BPIN 202400000000162 - Ampliación gradual y continua de la capacidad instalada en la infraestructura y dotación hospitalaria para mejorar el acceso a los servicios de salud BPIN nacional



- BPIN 202500000025369 - Fortalecimiento a la prestación de los servicios de salud en el componente de transporte asistencial en el territorio nacional
- 8 productos pertenecientes a 6 proyectos de inversión se encuentran en rango de ejecución Medio.
- 4 productos dentro de 4 proyectos de inversión se encuentran en rango de ejecución Alto

Se hace llamado a los gerentes y formuladores/gestores de proyectos para que, garantizando ante todo el cumplimiento de los objetivos y metas del Ministerio de Salud y Protección Social y del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia: potencia mundial de la vida”, evalúen en el transcurso de la vigencia (antes de su culminación) la pertinencia de actualizar las metas de los indicadores de producto de tal manera que reflejen la realidad de la ejecución de los proyectos de inversión y no se presenten sobre ejecuciones ni incumplimientos.

## 4. Conclusiones y Recomendaciones

### 4.1 Conclusiones

1. Al finalizar el tercer trimestre de la vigencia 2025, el Ministerio de Salud y Protección Social de manera consolidada presenta ejecución financiera de los recursos de inversión del 27,3% según las obligaciones contenidas en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF-Nación). Esta ejecución, de conformidad con los rangos de gestión establecidos para el Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra en rango Bajo.
2. En relación con la ejecución financiera individual de cada uno de los 15 proyectos establecida con respecto a las obligaciones, según los rangos de gestión establecidos para el Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra en rango bajo para la totalidad de los 15 proyectos de inversión.
3. En cuanto a la ejecución física representada en el avance en la entrega de productos de los proyectos de inversión, al corte septiembre de 2025, la mayoría de los productos (66 de un total de 87) se encuentran en rango de ejecución Bajo. Algunos productos (8 productos) se encuentran en rango de ejecución Medio. Y tan solo 4 productos se encuentran en rango de ejecución Alto.
4. Existen 4 proyectos de inversión que no presentan avance alguno en la ejecución física en cuanto a entrega de productos.

### 4.2 Recomendaciones

1. Se recomienda a los gerentes y formuladores/gestores de proyectos de inversión validar las alertas generadas al interior de los informes de seguimiento a los proyectos de inversión que se elaboran y publican trimestralmente, con el propósito de tomar las acciones correctivas necesarias, de manera oportuna. Los informes se encuentran publicados en la página web institucional del Ministerio de Salud y Protección Social en el enlace:  
<https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx>
2. Se reitera a los formuladores/gestores y a los gerentes de proyectos de inversión la necesidad de que los proyectos carguen el informe avance mensual proyectos de inversión formato “Informe avance mensual proyectos de inversión” (DESF24) en la opción de soportes de la PIIP. Esto permite conservar la trazabilidad de las modificaciones que se realicen a los proyectos e identificar las dificultades que se hayan presentado para el logro de las metas.
3. Es imperante que los responsables del registro de información en la Plataforma Integrada de Inversión Pública PIIP registren el avance en los productos. Se evidencian productos con resultado de avance (0) cero o bajo.
4. Aunado a lo anterior es necesario registrar avance en el módulo de focalización para los proyectos que tienen la obligación de atender compromisos y metas asociados con trazadores presupuestales.



5. Es pertinente indicar que, de conformidad con la Circular 032 de la Contraloría General de la República, la información que requiera este ente de control en relación con la ejecución de los proyectos de inversión va a ser tomada de la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP). Por esta razón se invita a que diligencien este sistema de información con la oportunidad y calidad requeridas.

Elaboró: Grupo de Planeación.

Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

Aprobó: Jefe Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales

